


Protokół badania urządzeń piorunochronnych**NR PROTOKOŁU 2023/0185**

1.	Miejsce badania: KUCHNIA SP ZOZ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11, 41-500 CHORZÓW					
2.	Badana instalacja: INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU					
3.	Wykonawca pomiarów: ELEKTRIX – ROBERT SZYMASZEK, UL. DUBOIS 16, 44-100 GLIWICE Robert Szymaszek – nr upr. SEP E1/710/2801/19, SEP D1/710/2802/19					
4.	Metoda i rodzaj badania: BADANIE OKRESOWE					
5.	Data wykonania badania: 11.08.2023r.					
6.	Data następnego badania: SIERPIEŃ 2028r.					
7.	Do badania użyto przyrządu: MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA – MRU 200, NR FABR 702252; $R_p < 30 \Omega$ Pomiar rezystancji uziemienia wykonano metodą techniczną.					
8.	Warunki zewnętrzne: a) temperatura zewnętrzna: +20 stopni C (w ciągu ostatnich 3 dni brak przymrozków) b) opady: brak opadów (w ciągu ostatnich 3 dni brak opadów deszczu lub śniegu) c) typ podłoża: grunt mieszany					
9.	Wyniki badania a) oględziny części nadziemnej: WYNIK POZYTYWNY b) oględziny przewodów odprowadzających: WYNIK POZYTYWNY c) kontrola połączeń galwanicznych i skręcanych: WYNIK POZYTYWNY d) sprawdzenie stanu uzimów: STAN POZYTYWNY e) pomiar rezystancji uziemień (przyjęty współczynnik $K_p = 1.4$): <table border="1" data-bbox="258 1278 1299 1333"><tr><td>ZK-1 – 102,00 Ω</td><td>ZK-2 – uszkodzone</td><td>ZK-3 – 24,00 Ω</td><td>ZK-4 – 21,40 Ω</td><td>ZK-5 – 25,30 Ω</td></tr></table>	ZK-1 – 102,00 Ω	ZK-2 – uszkodzone	ZK-3 – 24,00 Ω	ZK-4 – 21,40 Ω	ZK-5 – 25,30 Ω
ZK-1 – 102,00 Ω	ZK-2 – uszkodzone	ZK-3 – 24,00 Ω	ZK-4 – 21,40 Ω	ZK-5 – 25,30 Ω		
10.	Uwagi i zalecenia: W trakcie pomiarów stwierdzono zawyżoną rezystancję uziemienia oraz uszkodzone złącza kontrolne. Uziemienia instalacji należy naprawić do wartości poniżej 10 Ω. Należy oczyścić a w razie konieczności wymienić zaciski i złącza kontrolne. Po dokonaniu niezbędnych napraw należy zakonserwować połączenia skręcane.					
11.	Ocena wyników badania: Po przeprowadzeniu badań technicznych postanowiono uznać badane urządzenie piorunochronne za SPRAWNE. Urządzenie piorunochronne NADAJE SIĘ do dalszej eksploatacji.					

ELEKTRIX - Robert Szymaszek
Projekty, Instalacje, Pomiary, Odbiory
44-100 Gliwice, ul. Stanisława Dubois 16
Tel: 693814215 NIP: 9371809120
www.elektrix.org

Inż. Robert Szymaszek
SEP E1/710/2801/19
SEP D1/710/2802/19

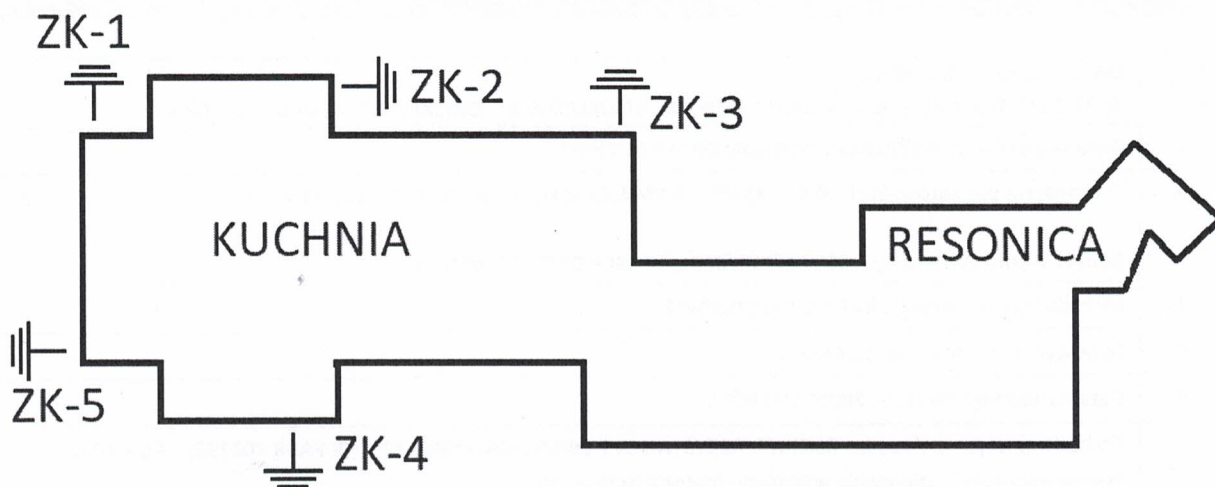

Schemat rozmieszczenia złącz kontrolnych ZK w instalacji odgromowej w budynku kuchni w SP ZOZ Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

ELEKTRIX - Robert Szymaszek

Projekty, Instalacje, Pomiar, Odbiory
44-100 Gliwice, ul. Stanisława Dubois 16
Tel: 693814215 NIP: 9371809120

www.elektrix.org


inż. Robert Szymaszek
SEP E 710/2801/19
SEP D 710/2802/19
